




Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chunchi

UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO

Teléfono (03)2936013

Oficio Núm. 005-DDCMCH-2022
Chunchi, 5 de enero del 2022

Licenciado.
Walter Narváz Macero
Presente.



De mi consideración:

Por medio de la presente llego a Usted con un cordial saludo, a la vez dando contestación al oficio Número 1248-AGADMCH, en el que solicita que se le haga llegar una evaluación de la Ejecución del presupuesto participativo 2021 con análisis del POA Y del PDYOT, para conocer hasta qué punto se está dando cumplimiento el mismo.


Una vez revisadas la cédula presupuestaria del mes de noviembre del 2001, referente a la asignación presupuestaria de cada parroquia se desprende la siguiente información:

PRESUPUESTO A PARROQUIAS PARROQUIAS

Cédula presupuestaria con corte Noviembre del 2021

APORTES AL:	ASIGNACIÓN INICIAL	PRESUP. EJECUTADO	PORCENT. EJECUCIÓN
GAD Parroquial Gonzol	51144,67	0	0,0%
GAD Parroquial Capsol	23055,83	18055,83	78,3%
GAD Parroquial Compud	16798,61	7317,77	43,6%
GAD Parroquial Llagos	24472,11	0	0,0%

PORCENTAJE EJECUCIÓN P.P. PARROQUIAS AÑO 2021

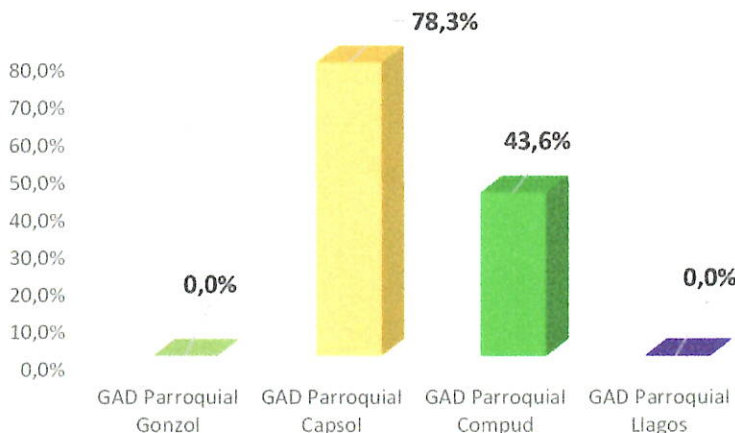

Atención
Financiera
Planes de Ejecución

[Handwritten signature]

07/01/2022

GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI - P.F.F. FINANCIERO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nº: 859 Nº: 099
Fecha: 11-01-2022
[Handwritten signature]
FIRMA



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chunchi

UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO

Teléfono (03)2936013

Es decir que el GAD Parroquial que se encuentra con mayor ejecución presupuestaria es el GAD de Capsol con un 78,3%; a continuación, se encuentra el GAD de Compud con un 43,6%; Los GADs parroquiales de Gonzol y Llagos, cuentan con un 0% de ejecución, pues aún no han entregado la documentación pertinente para que se realice la transferencia y puedan ejecutar las obras priorizadas.

También se presenta un resumen de las Obras o Proyectos Priorizados, en las Asambleas Participativas correspondiente al período 2019 – 2020, con su respectiva Observación del Estado de ejecución que se encuentran las determinadas Obras o Proyectos.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 Y 2020

PARROQUIA	PROYECTO	MONTO	OBSERVACIONES
GONZOL	1) Construcción de una cancha de Uso Múltiple con césped Sintético en la Unidad Educativa Gonzol por un monto \$18394,57 presupuesto 2019. 2) Cerramiento de la casa comunal y construcción de un galpón para guardar maquinaria. con un monto de \$8187,53 del P.P. 2020 3) Construcción de baterías Sanitarias en la cancha central de la comunidad de Zúnag, con un monto de \$ 8187,52 con presupuesto participativo 2020.	34769,62	NO EJECUTADO
CAPSOL	"Reconstrucción del Sistema de Agua potable para la comunidad de Pacucansha para el año 2019, con un monto de \$10.433,71. Reconstrucción de la cancha de la comunidad de Piñancay \$13094,74 con presupuesto del año 2020	23528,45	La Reconstrucción del Sistema de Agua potable para la comunidad de Pacucansha es una obra concluida mediante Acta Entrega- Recepción provisional Ejecutada por el Municipio Del presupuesto participativo 2019. Para el Presupuesto Participativo 2020, se cambió de obra por: Construcción del Edificio Administrativo del GAD Parroquial de Capsol par



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chunchi

UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO

Teléfono (03)2936013

COMPUD	1)Adoquinado de la vía a Llalla”, por un monto de \$13721,05. correspondiente al PP del 2019 y 2) El “Estudio para el sistema de agua Potable para la comunidad de Saguin, por un monto de \$4.000 y 3) “Adoquinado de las calles de la cabecera Parroquial (frene al Subcentro de salud)”, por un monto de \$8.058,19 correspondiente al presupuesto participativo del 2020	25779,24	Se reformuló el presupuesto participativo correspondiente al año 20219, por el Cambio de la cubierta e implementación de losa y mampara en la casa Parroquial por un monto de \$13721,05. Así como también se reformuló el presupuesto participativo 2020, por las siguientes obras: Re adoquinado de las calles del centro Parroquial, por un monto de \$7317,77 el mismo que ya está ejecutado. y por la construcción de un bloque de bóvedas en el cementerio de la parroquia Compud por un monto de \$4740,42 , la misma que se encuentra elaborando el convenio en el GAD Municipal
LLAGOS	1)Ampliación de la red de alcantarillado de la comunidad de San Pedro de Joyagshí” con PP 2019. 2)Construcción de la Primera etapa del sistema de alcantarillado de la comunidad de San Cristóbal con PP 2020	44074,68	Proyecto ejecutado en su totalidad, obra terminada

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

PARROQUIA	PROYECTO	MONTO	OBSERVACIÓN
GONZOL	Adoquinado para las comunidades de Iltus y San Martín	16375,05	NO EJECUTADO
CAPSOL	Construcción del Edificio Administrativo del GAD Parroquial de Capsol	12894,46	EN PLENA EJECUCIÓN DEL EDIFICIO
COMPUD	Adoquinado para la comunidad de Llalla y Centro parroquial	12058,19	Se reformuló el presupuesto participativo 2021 y también fue priorizado para el año 2022 para que quede completa la obra de: adoquinado de la vía a Saguin Alto por un monto de \$16288,67.
LLAGOS	Construcción de Alcantarillado en San Cristóbal y Joyagshí	24472,11	Tramo pendiente por ejecutarse de los presupuestos 2019 y 2020



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chunchi

UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO

Teléfono (03)2936013

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

PARROQUIA	PROYECTO	MONTO	OBSERVACIÓN
GONZOL	Construcción de la segunda Planta de la Casa Parroquial Primera Fase	15447,12	PRIORIZADO Aún no se inicia con los trámites
CAPSOL	Reparación, rehabilitación y renovación de la red de agua de consumo humano de la comunidad Pasaloma (Churupamba)	11329,84	PRIORIZADO Aún no se inicia con los trámites
COMPUD	"Adoquinado de la vía a Saguin Alto correspondiente a los años 2021 y 2022	16288,67	Presentación de documentos habilitantes
LLAGOS	Construcción de la primera etapa del Salón de Actos, en la cabecera Parroquial	22934,37	Se cuenta con el proyecto obra por ejecutarse

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;


Tigo Eduardo Espinoza C.
ANALISTA DE DESARROLLO COMUNITARIO
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

